



NBP

Narodowy Bank Polski

Adam Tochmański, Departament Systemu Płatniczego NBP

Stan prac prowadzonych w NBP w Projekcie Konsolidacja T2-T2S

Spotkanie KGI AMI-Pay

Warszawa, 11 października 2019 r.



Dotychczasowe działania NBP skierowane do uczestników TARGET2-NBP w związku z konsolidacją systemu TARGET2 z platformą TARGET2-Securities (konsolidacja T2-T2S)

- Spotkanie Krajowej Grupy Użytkowników TARGET2 (KGU-TARGET2) w czerwcu 2017 r.
- Spotkania Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-Pay (KGI AMI-Pay) w marcu i grudniu 2018 r.


NBP zaprezentował główne założenia konsolidacji T2-T2S oraz zasady raportowania do NBP gotowości uczestników TARGET2-NBP do migracji na nowy system T2.

- Przedstawienie materiału informacyjnego nt. konsolidacji T2-T2S na potrzeby Rady ds. Systemu Płatniczego w grudniu 2018 r.
- Informacja dla uczestników TARGET2-NBP w grudniu 2018 r. na temat rozpoczęcia prac w ramach projektu Konsolidacja T2-T2S, w tym procesu monitorowania przez EBC poziomu gotowości uczestników systemu do migracji
- Przekazywanie osobom do kontaktu w sprawie projektu po stronie uczestników bieżących informacji dotyczących założeń i przygotowań do migracji, w tym dokumentacji systemu, wyboru dostawców usług sieciowych, nowych komunikatów itd.
- Utworzenie dedykowanej skrzynki mailowej T2konsolidacja@nbp.pl, na którą mogą być kierowane wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konsolidacji T2-T2S

Najważniejsze założenia EBC dotyczące konsolidacji systemu TARGET2 z platformą TARGET2-Securities (konsolidacja T2-T2S)

- Przejście na komunikaty MX, zgodne ze standardem ISO 20022
- Możliwość wyboru dostawcy usług sieciowych oraz wielowalutowość nowego systemu
- Przyjęcie założenia migracji na zasadzie Big Bang:
 - wymagający harmonogram realizacji projektu – przygotowań do migracji do nowego systemu
 - opóźnienie w gotowości do migracji będzie dla uczestników systemu TARGET2 oznaczało brak bezpośredniego dostępu do rozrachunku płatności i rozrachunku systemów zewnętrznych w pieniądzu banku centralnego w euro, brak możliwości otrzymywania kredytu intraday, konieczność zapewnienia sobie dostępu do płatności w euro za pośrednictwem innego podmiotu.
- Ścisły monitoring i nadzór EBC nad postępem prac przygotowawczych zarówno banków centralnych, jak i pozostałych uczestników systemu TARGET2 – system cyklicznego raportowania nt. gotowości do połączenia z nowym systemem RTGS

Grupy robocze zaangażowane w konsolidację T2-T2S w strukturze zarządczej EBC

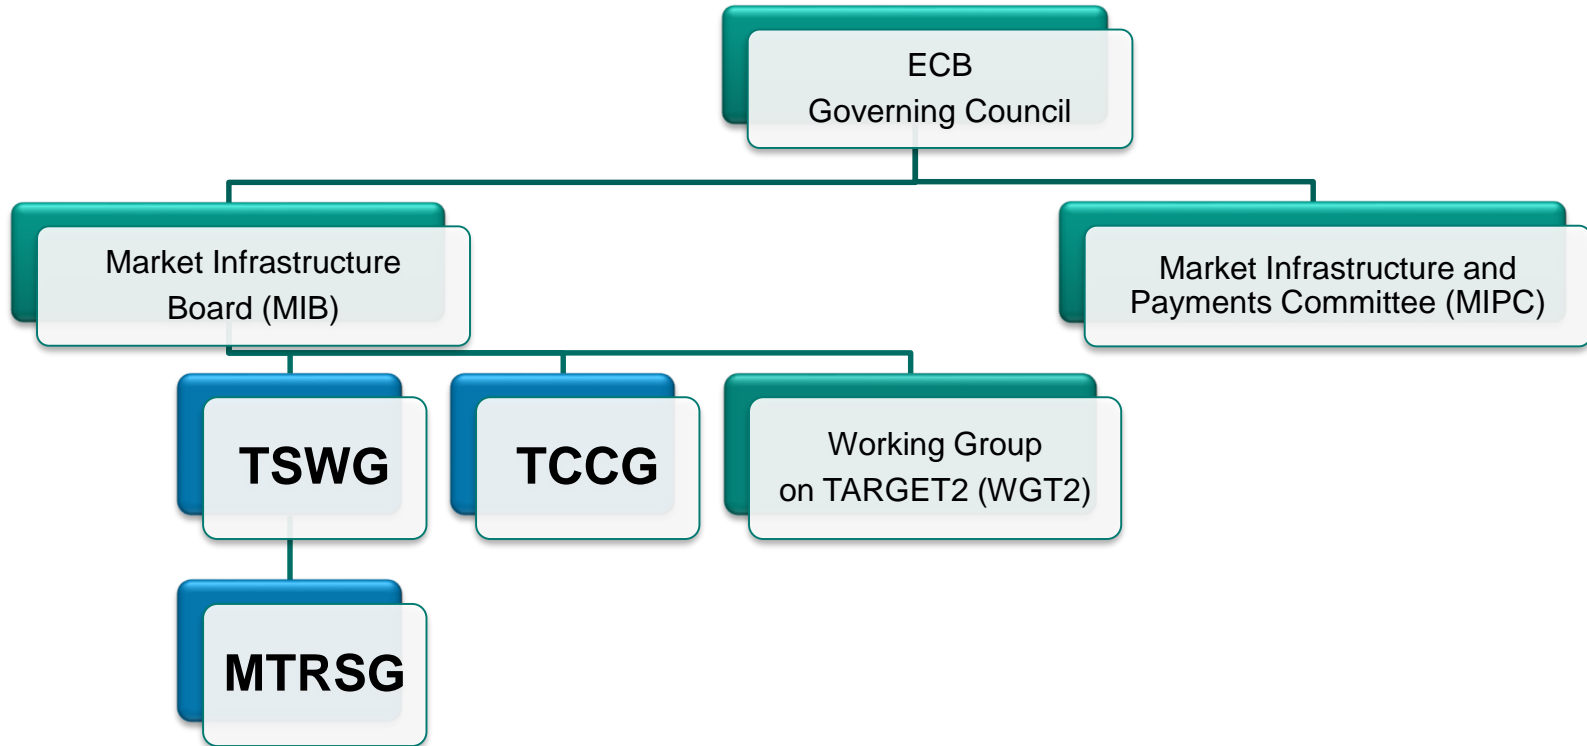

Organizacja prac EBC związanych z konsolidacją T2-T2S

- TARGET Consolidation Contact Group (TCCG) – działa od lutego 2018 r. (kontynuuje prace prowadzone od grudnia 2016 r. w ramach Task Force on Future RTGS Services). Odpowiedzialna przede wszystkim za opracowanie dokumentacji funkcjonalnej nowego systemu.
- TARGET Services Working Group (TSWG) – działa od marca 2018 r., dedykowana bankom centralnym. Odpowiedzialna za nowy, skonsolidowany system i zapewnienie gotowości banków centralnych do migracji na TIPS.
 - T2 Migration Testing and Readiness Subgroup (MTRSG) – działa od stycznia 2019 r., podgrupa TSWG odpowiedzialna za wypracowanie szczegółowych zasad migracji na nowy system, a także za raportowanie poziomu gotowości uczestników do migracji.
- Pozostałe grupy robocze i zespoły zadaniowe (np. T2/T2S Consolidation Project Task Force przy Komitecie AMICO).

Terminy realizacji zadań w ramach konsolidacji T2-T2S oczekiwane przez EBC – podstawa harmonogramu Projektu Konsolidacja T2-T2S (*Overall key milestones to ensure a successful big-bang migration in November 2021*)

2018	grudzień	<ul style="list-style-type: none"> ▪ uruchomienie projektu
2019	marzec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rozpoczęcie prac analitycznych – wewnętrzna ocena zakresu prac dostosowawczych
	15 lipca	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ustalenie kryteriów wyboru dostawcy usług sieciowych
	wrzesień	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakończenie prac analitycznych, w tym oceny zakresu prac dostosowawczych ▪ rozpoczęcie prac nad dokumentacją zmian w systemach informatycznych
	grudzień	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ustalenie strategii podłączenia do nowego systemu
2020	marzec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakończenie prac nad dokumentacją zmian w systemach informatycznych ▪ rozpoczęcie prac nad dostosowaniem oprogramowania do nowych wymogów T2 ▪ przygotowanie umowy z dostawcą usług sieciowych
	czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rozpoczęcie testów wewnętrznych
	lipiec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wybór dostawcy usług sieciowych – podpisanie umowy
	październik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowanie oprogramowania do nowych wymogów T2
	grudzień	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakończenie testów wewnętrznych ▪ rozpoczęcie testów łączności
2021	lutym	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakończenie testów łączności i rozpoczęcie testów z użytkownikami
	wrzesień	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakończenie testów z użytkownikami ▪ zakończenie prac związanych ze zmianami prawnymi ▪ zakończenie szkoleń pracowników
	1 października	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gotowość do migracji w środowisku produkcyjnym
	5 listopada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakończenie działań migracyjnych
	22 listopada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ uruchomienie T2 service

Plan działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2019-2021, przyjęty przez Zarząd NBP w dniu 25 października 2018 r.

Zadanie nr 13:

Przygotowanie NBP do uczestnictwa w skonsolidowanym systemie TARGET2

- Efekt końcowy: uczestnictwo NBP w systemie powstałym z konsolidacji systemu TARGET2 i platformy TARGET2-Securities
- Termin realizacji: 2019-2021
- Odpowiedzialny: Departament Systemu Płatniczego (DSP)
- We współpracy z: Departamentem Informatyki i Telekomunikacji (DIT), Departamentem Rachunkowości i Finansów (DRF), Departamentem Operacji Krajowych (DOK), Departamentem Rozliczeń Transakcji Finansowych (DRTF), Departamentem Prawnym (DP), Departamentem Operacji Zagranicznych (DOZ)

Projekt Konsolidacja T2-T2S w NBP

- Uruchomienie decyzją Zarządu NBP w dniu 7 lutego 2019 r.
- Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu (KSP) Konsolidacja T2-T2S w dniu 18 lutego 2019 r.
- Skład KSP Konsolidacja T2-T2S:
 - Przewodnicząca: pani Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP
 - Przedstawiciel inicjatora: pan Adam Tochmański, Dyrektor DSP
 - Przedstawiciel wykonawców: pan Witold Wieteska, Zastępca Dyrektora DIT
- Kierownik projektu: pani Agnieszka Gajo, Naczelnik WRSP w DSP
- Zespół projektowy: 60 osób z 7 departamentów: DSP, DIT, DOK, DOZ, DP, DRF, DRTF
- Uruchomienie dedykowanej skrzynki kontaktowej dla uczestników TARGET2-NBP – T2konsolidacja@nbp.pl
- Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z uczestnikami TARGET2-NBP w sprawie konsolidacji T2-T2S i monitorowania przez EBC poziomu gotowości uczestników do migracji

Harmonogram realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S w NBP

I kwartał 2019 r.

Rozpoczęcie realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S, utworzenie Komitetu Sterującego Projektu oraz powołanie Zespołu Projektowego

Od III 2019 r. do 23 XII 2019 r.

Prace analityczne:

- analiza wymagań biznesowych i funkcjonalnych nowego systemu,
- rozpoczęcie procedury wyboru dostawcy usług sieciowych,
- określenie zakresu zmian w systemach informatycznych NBP

Od 24 XII 2019 r. do 30 IX 2021 r.

Prace wykonawcze i testy:

- implementacja zmian w systemach informatycznych NBP oraz wewnętrznych procedurach NBP,
- zakończenie procedury wyboru dostawcy usług sieciowych,
- testy

Od 1 X 2021 r. do 22 XI 2021 r.

Wdrożenie nowego systemu:

- gotowość do rozpoczęcia migracji w środowisku produkcyjnym,
- migracja NBP do nowego systemu,
- uruchomienie nowego systemu

Do 31 XII 2021 r.

Zakończenie projektu

Najbliższe planowane działania związane z projektem

- Określenie zakresu zmian w poszczególnych systemach informatycznych NBP i rozpoczęcie prac nad dostosowaniem oprogramowania
- Wybór dostawcy usług sieciowych i podpisanie umowy
- Rozpoczęcie testów wewnętrznych
- Ścisłe monitorowanie przygotowań po stronie uczestników TARGET2-NBP
- Udostępnienie przez EBC pierwszych projektów dokumentacji prawnej i operacyjnej nowego systemu planowane na lipiec 2020 r. – możliwe konsultacje z uczestnikami rynku w III kwartale 2020 r.; publikacja wytycznych EBC dotyczących nowego systemu planowana jest na dzień 26 lutego 2021 r.
- Kolejne spotkania z uczestnikami TARGET2-NBP poświęcone dalszym pracom nad Projektem Konsolidacji T2-T2S (2020 r.)
- Bieżące przekazywanie uczestnikom TARGET2-NBP dalszych istotnych informacji na temat procesu przygotowań do migracji za pośrednictwem skrzynki T2konsolidacja@nbp.pl

Prośba o aktualne dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za realizację projektu Konsolidacja T2-T2S

- Prosimy o przekazywanie aktualnych danych kontaktowych do osób zajmujących się w Państwa instytucjach projektem na adres:

T2konsolidacja@nbp.pl

- Wszelkie pytania lub wątpliwości również prosimy kierować na ten adres.



Narodowy Bank Polski

Adam Tochmański

Dyrektor

Departament Systemu Płatniczego

adam.tochmanski@nbp.pl
